


SDP - Vista 3D - Sud-Est



**PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA  
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE  
CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV)**

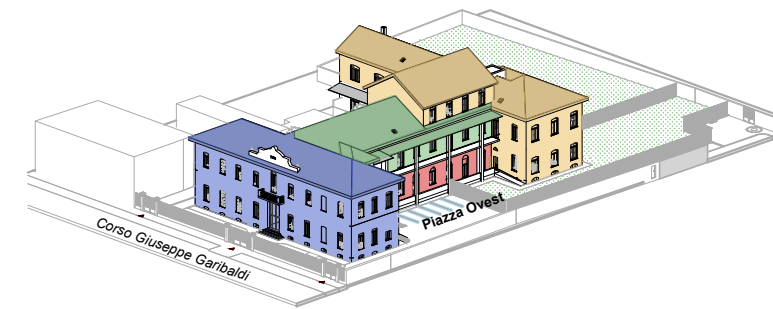

<p>Comune</p> <p>Comune di Pavia Piazza Municipio, 2 - 27100 - Pavia (PV) Partita IVA: 00296180185 Tel.: 0382 3991 PEC: protocollo@pec.comune.pavia.it</p>	<p>Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.1</p>
--	---

CAPOGRUPPO/MANDATARIA

**GP PROJECT SRL**  
Sede Legale: Via Pietro Tamburini, 6 - 20123 Milano (MI)  
Sede Operativa: Strada 6 - Palazzo N3 - Centro Direzionale Milanofori - 20089 - ROZZANO (MI)  
P.IVA 05835490961 - REA N° MI - 1852211 - Tel. 02 89 20 81 64 - info@gpproject.eu

<p>MANDANTE: Dott. Arch. Maria Teresa PASCALÉ</p> <p>Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria n. A 3220 pec: mtascalle@oaopc-rc.it Tel.: +39 349 786 7001</p>	<p>MANDANTE: Dott. Geol. Domenico MONTELEONE</p> <p>Ordine dei Geologi della Calabria n. 1025 pec: monteleonedomenico@pec.it Tel.: +39 329 082 6033</p>
---	---

**Progetto Definitivo - Esecutivo**  
**PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE**  
**CORSO GARIBALDI, 69 - PAVIA (PV) - POP317\_PNRR/6 - CUP: G14E21000720001**

<table border="1"> <thead> <tr> <th>n°</th> <th>Revisioni</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Febbraio 2023</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Marzo 2023</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	n°	Revisioni	1	Febbraio 2023	2	Marzo 2023	3		4		5		6		7		<p>Disegnato da:</p> <p>Revisionato da:</p>	<p>Progetto architettonico</p> <p><b>Fasi di cantiere 1 di 2</b></p> <table border="1"> <tr> <td>DISCIPLINA</td> <td>ELABORATO N°</td> </tr> <tr> <td><b>SIC</b></td> <td><b>02</b></td> </tr> </table>	DISCIPLINA	ELABORATO N°	<b>SIC</b>	<b>02</b>
n°	Revisioni																					
1	Febbraio 2023																					
2	Marzo 2023																					
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
DISCIPLINA	ELABORATO N°																					
<b>SIC</b>	<b>02</b>																					

**DESCRIZIONE ATTIVITA'**

Per garantire le attività presenti all'interno del fabbricato, l'impresa appaltatrice dovrà eseguire i lavori per fasi e priorità.

I lavori inizieranno all'interno del Padiglione Nord (zona ingresso + atrio) come indicato nelle aree colorate di azzurro. Successivamente riprenderanno i lavori nella zona a sud (sia al Piano Terra che al Piano Primo, ovvero negli spazi attualmente destinati al Consorzio Pavese), al Piano Primo nelle aree ora destinate alla Tutela dei Minori e al Piano Secondo (indicate con il colore giallo); in questo modo i dipendenti potranno usufruire degli spazi già sistemati indicati della fase 1.

Una volta terminate le attività lavorative a sud, si procederà con il primo piano della zona centrale (indicata in verde).

L'ultima fase lavorativa riguarderà il piano terreno (indicate con il colore rosso).

**FASI ATTIVITÀ LAVORATIVE**

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | PADIGLIONE NORD  | 4   | ZONA CENTRALE PIANO TERRENO<br>I dipendenti lavorano in padiglione nord e zona centrale al primo piano |
| 2 | PADIGLIONE SUD (ovvero CONSORZIO PAVESE Piano Terreno + Piano Primo) + AREA MINORI (Piano Primo)       | CENTRO ANTIVIOLENZA AL PIANO TERRENO<br>NON OGGETTO DI INTERVENTO |  |
| 3 | ZONA CENTRALE PIANO PRIMO<br>I dipendenti lavorano in padiglione nord e zona centrale al secondo piano |   |  |
