




COMUNE DI PAVIA

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**  
**SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI E ARREDO URBANO**  
**VIA SCOPOLI, 1 - 27100 PAVIA**

**PIAZZALE CROSIONE**

**VIA PONTE VECCHIO**

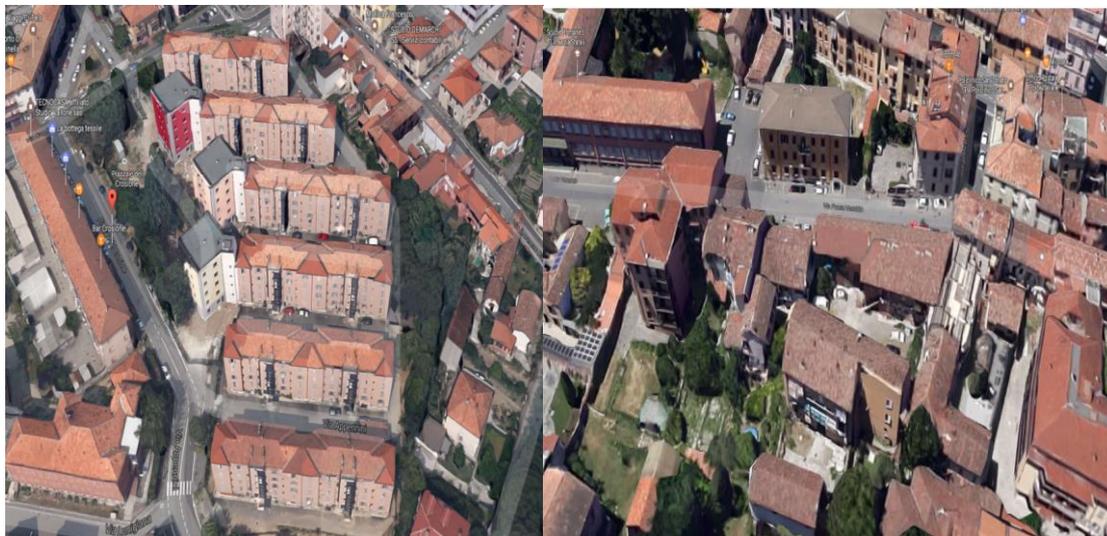

**INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 6079 DEL 29/12/2016 -  
TIPOLOGIA B: ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI UNITA' ABITATIVE  
DESTINATE ALL'ACCOGLIENZA E PROTEZIONE DI DONNE VITTIME DI  
VIOLENZA - LOTTI 1-2-3 (cod. int. POP 173) – CUP G15J18000060006**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**ALLEGATO 20 – CRONOPROGRAMMA**

**GRUPPO DI LAVORO:**

Responsabile del Procedimento: ing. Luigi Abelli - UTC

Progettisti: geom. Matteo Cicchinè - Tromello – (PV) Progettista incaricato  
ing. Marcello Vecchio – San Genesio ed Ambito impiantistico e certificazione energetica  
Uniti – (PV)

Supporto al RUP: rag. Laura Ambrosetti  
dott. Alberto Bianchi  
dott.ssa Nicoletta Casorati  
arch. Luigi Ferrari  
ing. Sara Garavani

Pavia, li 4 dicembre 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.  
(arch. Mauro Mericco)

Fasi	Adempimenti/Atti/Opere	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	
	Mesi			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Scadenza Bando		entro il 29/09/2017																								
2	Definizione Graduatorie			prevista entro 28/02/2018 effettuata il 01/03/2018																							
3	Accettazione Contributo + Impegno ad adeguare i progetti alla prescrizioni della commissione di valutazione								entro 31/03/2018																		
4	Approvazione regionale progetto di valorizzazione e conferma finanziamento							prevista entro 31/05/2018 effettuata il 23/07/2018 comunicata il 02/08/2018																			
5	Approvazione progetto definitivo+schema convenzione													entro 30/09/2018													
6	Titolo abilitativo (progetto esecutivo)															entro 31/10/ 2018											
7	Procedura di affidamento dei lavori e formalizzazione del contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016																entro 31/12/2018										
8	Inizio lavori																	entro 31/01/2019									
9	esecuzione lavori																			90 gg							
10	collaudo																						60 gg				
10	Consegna alloggi																								entro il 31/07/ 2019		

**LEGENDA**

-  Attività completate
-  Attività in corso di attuazione
-  Attività da completare
